

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

FECHA PLANILLA:	martes, 31 de octubre de 2023	FECHA DE CONTRATO:	04-oct-23
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.	FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	
UBICACIÓN:	PARROQUIA AMAZONAS	FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	04-oct-23
No. CONTRATO:		PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)	15
MONTO CONTRATO:	1,175.42 USD	AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:	
MONTO ANTICIPO:	USD	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	19-oct-23
CONTRATISTA:	SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:	19-oct-23
TÉCNICO OBSERVADOR:	ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:	25-oct-23
PARTIDA PRESUPUESTARIA:		DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:	
	PERIODO DESDE 04/10/2023 HASTA 25/10/2023	DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:	6

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO										OBSERV.		
			CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			AVANCE		AUMENTO			DISMINUCIÓN	
						ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	PRESENTE	TOTAL	CANT.	MONTO		CANT.	MONTO
1.00	TABLÓN DE MADERA (2.00X0.20x0.05)cm,	U	64.00	9.30	595.20	66.00	66.00		613.80	613.80		103%	103%	2.00	18.6			
2.00	VIGA DE MADERA (200X10x10)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO	U	13.00	7.50	97.50	13.00	13.00		97.50	97.50		100%	100%					
3.00	VIGUETA DE MADERA (10x5)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO	ML	50.00	2.00	100.00	52.00	52.00		104.00	104.00		104%	104%	2.00	4			
4.00	PINTURA ANTICORROSIVA	kg	174.00	0.28	48.72	174.57	174.57		48.88	48.88		100%	100%	0.57	0.16			
5.00	PINTURA LÁTEX	m2	20.00	3.10	62.00	13.92	13.92		43.15	43.15		70%	70%			6	18.85	
6.00	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA	m2	32.00	6.00	192.00	31.20	31.20		187.20	187.20		98%	98%			1	4.8	
7.00	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN ACÉMILA	GLB	1.00	80.00	80.00	1.00	1.00		80.00	80.00		100%	100%					
SUBTOTAL						1,175.42				1,174.53	1,174.53							
TOTAL						1,175.42				1,174.53	1,174.53					22.76		23.65

RESUMEN DE LA PLANILLA ÚNICA		
DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	TOTAL
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL		1,174.54
VALOR IVA 12%		140.94
VALOR PLANILLA MAS IVA		1,315.48
DESC. DEL ANTICIPO 0%		
DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%)		20.55
DESC. 100% DEL 12% IVA		140.94
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)		7.05
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)		7.05
VALOR A PAGAR		1,146.94

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 94/100 DÓLARES

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADORA

SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.
CONTRATISTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.
UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
CONTRATISTA: SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.
TÉCNICO OBSERVADOR (A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1.000 TABLÓN DE MADERA (2.00X0.20x0.05)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	UNIDAD U	OBSERVACIONES
13	2	26	1	26	AREA DE PUENTE
2	0.2	0.4	1	0.4	AREA DE CADA TABLON
		65			NUMERO DE TABLONES
TOTAL				66	

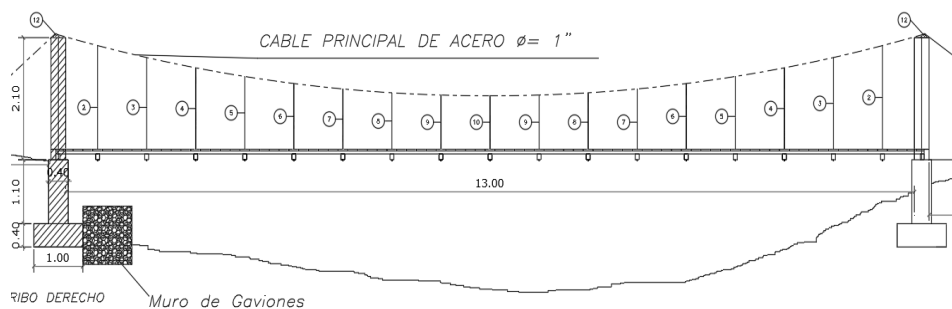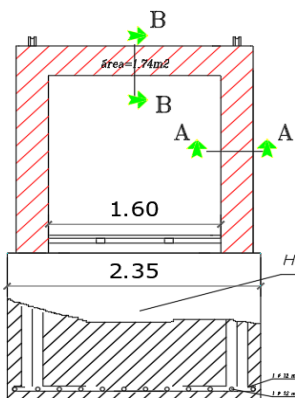

2.000 VIGA DE MADERA (200X10x10)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD U	OBSERVACIONES
				13.00	VIGAS DE MADERA 13 PENDOLAS
TOTAL				13.00	

3 VIGUETA DE MADERA (10x5)cm, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO

LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD ML	OBSERVACIONES
13			4	52.00	VIGUETAS DE PUENTE
TOTAL				52.00	


4 PINTURA ANTICORROSIVA

LONGITUD DE VARILLAS DE 14mm PARA PÉNDOLAS	ANCHO	PESO/ML	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			KG	
144.51		1.21	174.57	PINTURA DE PENDOLAS DE PUENTE
TOTAL			174.57	

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ancho	altura	long	DIÁMETRO
1	1					1"
2	4	PÉNDOLA L=2.00				14 mm
3	4	PÉNDOLA L=1.78				14 mm
4	4	PÉNDOLA L=1.61				14 mm
5	4	PÉNDOLA L=1.46				14 mm
6	4	PÉNDOLA L=1.34				14 mm
7	4	PÉNDOLA L=1.24				14 mm
8	4	PÉNDOLA L=1.18				14 mm
9	4	PÉNDOLA L=1.14				14 mm
10	2	PÉNDOLA L=1.13				14 mm

5 PINTURA LÁTEX

LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	UNIDAD M2	OBSERVACIONES
		1.74	4	6.96	VEREDA IZQUIERDA
2.1	0.30		4	2.52	
2.2	0.30		2	1.32	
1.80	0.30		4	2.16	VEREDA DERECHA
1.60	0.30		2	0.96	
TOTAL				13.92	

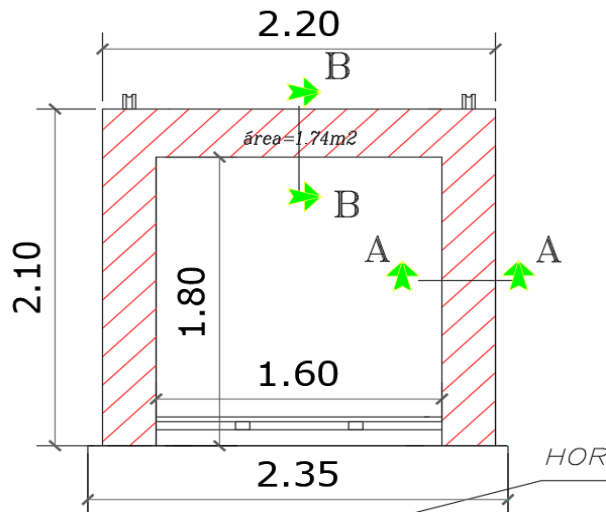

6 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA

LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD M2	OBSERVACIONES
2.4	13.00			31.20	
TOTAL				31.20	

7 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS EN ACÉMILA

LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD GBL	OBSERVACIONES
				1	
TOTAL				1.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

ANEXO FOTOGRÁFICO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.
UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
CONTRATISTA: SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.
TÉCNICO OBSERVADOR (A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
Planilla de Obra No.: PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

